

クレーム報告書

現場名 深谷市 S様邸 門柱補修工事


施工日 平成15年

< 状況報告 >

8月30日、お客様から門扉が傾いたとの連絡が入り、現況確認すると、門扉柱回りに排水管が複雑に通っており、その影響で十分に柱に根巻コンクリートを打てなかったために、徐々に沈下してしまったと思われる。

< 対策 >

補強工事としては、傾いてしまった柱回りを掘削、根巻コンクリートを解体、前後左右の水平を確認後、生コンを打ち込んだ。その後は、中1日養生させて頂いてから仮枠を撤去した。

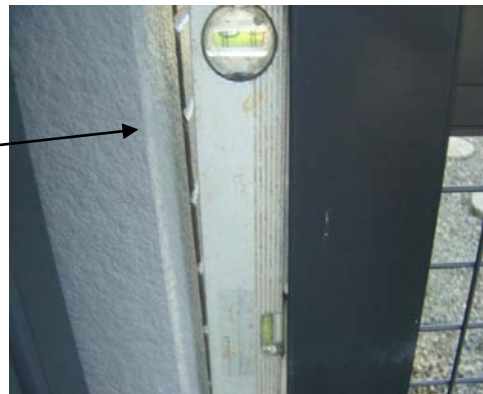

(施工前)



(補強、基礎工事)



(施工後)
